

# Příprava projektu

---

# Základní východiska

---

- ❑ Nutnost pečlivé přípravy
- ❑ Zpracování projektového záměru (abstraktu projektu)
- ❑ Neustálé konzultace s administrátorem dotace (i to se hodnotí při hodnocení projektu)
- ❑ Kvalitní příprava ulehčí hodně práce při realizaci projektu (předcházení případným problémům)
- ❑ Audit dotačních možností (26 operačních programů – [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz))
- ❑ Specifika jednotlivých operačních programů

## Programy 2007 — 2013

Tematické operační programy	Regionální operační programy	Operační programy Praha	Evropská územní spolupráce
 <p> <a href="#">Integrovaný operační program</a>  <a href="#">OP Podnikání a inovace</a>  <a href="#">OP Životní prostředí</a>  <a href="#">OP Doprava</a>  <a href="#">OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</a>  <a href="#">OP Výzkum a vývoj pro inovace</a>  <a href="#">OP Lidské zdroje a zaměstnanost</a>  <a href="#">Operační program Technická pomoc</a> </p>	 <p> <a href="#">ROP NUTS II Severozápad</a>  <a href="#">ROP NUTS II Severovýchod</a>  <a href="#">ROP NUTS II Střední Čechy</a>  <a href="#">ROP NUTS II Jihozápad</a>  <a href="#">ROP NUTS II Jihovýchod</a>  <a href="#">ROP NUTS II Moravskoslezsko</a>  <a href="#">ROP NUTS II Střední Morava</a> </p>	 <p> <a href="#">OP Praha Konkurenceschopnost</a>  <a href="#">OP Praha Adaptabilita</a> </p>	 <p> <a href="#">OP Mezuregionální spolupráce</a>  <a href="#">OP Nadnárodní spolupráce ESPON 2013</a>  <a href="#">INTERACT II</a>  <a href="#">Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013</a>  <a href="#">OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013</a>  <a href="#">Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013</a>  <a href="#">Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou</a>  <a href="#">Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013</a> </p>

# Příprava projektu

---

## Základní dokumenty:

- Výběr a prostudování konkrétního programu
  
  - Doplnující dokumentace ke každému programu
-

# Struktura dokumentů operační program

<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost-verze-z-1-10-2007>

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost\_ září 2007

## Obsah

Úvod.....	1
I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání .....	5
Normativní rámec vzdělávání v ČR.....	5
Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání .....	5
Systém vzdělávání v ČR.....	13
Vzdělávání a konkurenceschopnost.....	27
Zkušenosti z minulého období .....	35
SWOT analýza .....	36
II. Strategie OP VK .....	40
Globální cíl a specifické cíle OP VK.....	41
Identifikace prioritních os OP VK.....	41
Konzistence OP VK se strategickými dokumenty.....	47
Vazba OP VK na další operační programy.....	54
Dopady OP VK.....	57
Výsledky ex-ante evaluace .....	59
Dopady OP VK na životní prostředí.....	61
Uplatnění principu partnerství .....	61
III. Prioritní osy a indikátory .....	63
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání.....	65
Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.....	74
Prioritní osa 3 - Další vzdělávání.....	80
Prioritní osa 4a - Systémový rámec celoživotního učení (Cíl Konvergence).....	85
Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).....	85
Prioritní osa 5a - Technická pomoc (cíl Konvergence).....	91
Prioritní osa 5b - Technická pomoc (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).....	91
Indikátory pro monitoring a evaluaci.....	95
IV. Implementace OP VK.....	112
1. Orgány řízení a implementace operačního programu.....	112
2. Monitorování operačního programu.....	121
4. Systém finanční kontroly.....	130
6. Finanční toky.....	134
7. Informace a publicita.....	135
8. Finanční podmínky OP VK.....	137



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Struktura dokumentů – prováděcí dokument operačního programu

<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadedci-dokument-op-vk-verze-k-5-2-2010>

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

<b>Obrázek</b>	
1 Úvod	9
2 Strategie programu	10
3 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání	14
3.1 Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání	16
3.1.1 Zaměření podpory	16
3.1.2 Cíle oblasti podpory	16
3.1.3 Podporované aktivity	17
3.1.4 Typ podpory	19
3.1.5 Forma a výše podpory	19
3.1.6 Přijemci	19
3.1.7 Cílové skupiny	21
3.1.8 Územní zaměření podpory	22
3.1.9 Časový plán	22
3.1.10 Kategorie oblasti intervence	22
3.1.11 Veřejná podpora	22
3.1.12 Indikátory	23
3.1.13 Finanční plán	26
3.2 Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	27
3.2.1 Zaměření podpory	27
3.2.2 Cíle oblasti podpory	27
3.2.3 Podporované aktivity	28
3.2.4 Typ podpory	29
3.2.5 Forma a výše podpory	29
3.2.6 Přijemci	30
3.2.7 Cílové skupiny	31
3.2.8 Územní zaměření podpory	32
3.2.9 Časový plán	32
3.2.10 Kategorie oblasti intervence	32
3.2.11 Veřejná podpora	32
3.2.12 Indikátory	33
3.2.13 Finanční plán	37
3.3 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	38
3.3.1 Zaměření podpory	38

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4.1.8 Územní zaměření podpory	58
4.1.9 Časový plán	58
4.1.10 Kategorie oblasti intervence	58
4.1.11 Veřejná podpora	58
4.1.12 Indikátory	59
4.1.13 Finanční plán	66
4.2 Oblast podpory 2.2 – Vysoké školství	67
4.2.1 Zaměření oblasti podpory	67
4.2.2 Cíle oblasti podpory	67
4.2.3 Podporované aktivity	67
4.2.4 Typ podpory	68
4.2.5 Forma a výše podpory	68
4.2.6 Přijemci	68
4.2.7 Cílové skupiny	69
4.2.8 Územní zaměření podpory	69
4.2.9 Časový plán	69
4.2.10 Kategorie oblasti intervence	69
4.2.11 Veřejná podpora	70
4.2.12 Indikátory	70
4.2.13 Finanční plán	76
4.3 Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji	77
4.3.1 Zaměření oblasti podpory	77
4.3.2 Cíle oblasti podpory	77
4.3.3 Podporované aktivity	77
4.3.4 Typ podpory	77
4.3.5 Forma a výše podpory	78
4.3.6 Přijemci	78
4.3.7 Cílové skupiny	78
4.3.8 Územní zaměření podpory	78
4.3.9 Časový plán	78
4.3.10 Kategorie oblasti intervence	79
4.3.11 Veřejná podpora	79
4.3.12 Indikátory	80
4.3.13 Finanční plán	87
4.4 Oblast podpory 2.4 – Partnerství a síť	88

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3.3.2 Cíle oblasti podpory	38
3.3.3 Podporované aktivity	39
3.3.4 Typ podpory	39
3.3.5 Forma a výše podpory	40
3.3.6 Přijemci	40
3.3.7 Cílové skupiny	42
3.3.8 Územní zaměření podpory	42
3.3.9 Časový plán	42
3.3.10 Kategorie oblasti intervence	42
3.3.11 Veřejná podpora	42
3.3.12 Indikátory	43
3.3.13 Finanční plán	46
3.4 Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách	47
3.4.1 Zaměření podpory	47
3.4.2 Cíle oblasti podpory	47
3.4.3 Podporované aktivity	47
3.4.4 Typ podpory	48
3.4.5 Forma a výše podpory	48
3.4.6 Přijemci	48
3.4.7 Cílové skupiny	49
3.4.8 Územní zaměření podpory	49
3.4.9 Časový plán	49
3.4.10 Kategorie oblasti intervence	49
3.4.11 Veřejná podpora	49
3.4.12 Indikátory	49
3.4.13 Finanční plán	53
4 Prioritní osa 2 – Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj	54
4.1 Oblast podpory 2.1 – Vytváření odborné vzdělávání	56
4.1.1 Zaměření oblasti podpory	56
4.1.2 Cíle oblasti podpory	56
4.1.3 Podporované aktivity	56
4.1.4 Typ podpory	57
4.1.5 Forma a výše podpory	57
4.1.6 Přijemci	57
4.1.7 Cílové skupiny	58

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4.4.1 Zaměření oblasti podpory	88
4.4.2 Cíle oblasti podpory	88
4.4.3 Podporované aktivity	88
4.4.4 Typ podpory	89
4.4.5 Forma a výše podpory	89
4.4.6 Přijemci	89
4.4.7 Cílové skupiny	90
4.4.8 Územní zaměření podpory	90
4.4.9 Časový plán	90
4.4.10 Kategorie oblasti intervence	90
4.4.11 Veřejná podpora	90
4.4.12 Indikátory	91
4.4.13 Finanční plán	94
5 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání	95
5.1 Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání	97
5.1.1 Zaměření podpory	97
5.1.2 Cíle oblasti podpory	97
5.1.3 Podporované aktivity	97
5.1.4 Typ podpory	97
5.1.5 Forma a výše podpory	98
5.1.6 Přijemci	98
5.1.7 Cílové skupiny	98
5.1.8 Územní zaměření podpory	98
5.1.9 Časový plán	98
5.1.10 Kategorie oblasti intervence	99
5.1.11 Veřejná podpora	99
5.1.12 Indikátory	99
5.1.13 Finanční plán	100
5.2 Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání	101
5.2.1 Zaměření podpory	101
5.2.2 Cíle oblasti podpory	101
5.2.3 Podporované aktivity	101
5.2.4 Typ podpory	102
5.2.5 Forma a výše podpory	102
5.2.6 Přijemci	102

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

5.2.7 Cílové skupiny	103
5.2.8 Územní zaměření podpory	103
5.2.9 Časový plán	103
5.2.10 Kategorie oblasti intervence	103
5.2.11 Veřejná podpora	104
5.2.12 Indikátory	105
5.2.13 Finanční plán	107
6 Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení (cil Konvergence)	108
6.1 Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec celoživotního učení	108
6.1.1 Zaměření podpory	108
6.1.2 Cíle oblasti podpory	109
6.1.3 Podporované aktivity	109
6.1.4 Typ podpory	111
6.1.5 Forma a výše podpory	111
6.1.6 Přijemci	111
6.1.7 Cílové skupiny	111
6.1.8 Územní zaměření podpory	112
6.1.9 Časový plán	112
6.1.10 Kategorie oblasti intervence	112
6.1.11 Veřejná podpora	112
6.1.12 Indikátory	113
6.1.13 Finanční plán	116
7 Prioritní osa 5a – Technická pomoc (cil Konvergence)	117
7.1 Oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programů	118
7.1.1 Zaměření podpory	118
7.1.2 Cíle oblasti podpory	118
7.1.3 Podporované aktivity	118
7.1.4 Typ podpory	119
7.1.5 Forma a výše podpory	119
7.1.6 Přijemci	119
7.1.7 Cílové skupiny	119
7.1.8 Územní zaměření podpory	119
7.1.9 Časový plán	119
7.1.10 Kategorie oblasti intervence	120
7.1.11 Indikátory	120

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

7.1.12 Finanční plán	122
7.2 Oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu	123
7.2.1 Zaměření podpory	123
7.2.2 Cíle oblasti podpory	123
7.2.3 Podporované aktivity	123
7.2.4 Typ podpory	123
7.2.5 Forma a výše podpory	123
7.2.6 Přijemci	124
7.2.7 Cílové skupiny	124
7.2.8 Územní zaměření podpory	124
7.2.9 Časový plán	124
7.2.10 Kategorie oblasti intervence	124
7.2.11 Indikátory	125
7.2.12 Finanční plán	126
7.3 Oblast podpory 5.3 – Zvyšování absorpční kapacity subjektů implementačních programů	127
7.3.1 Zaměření podpory	127
7.3.2 Cíle oblasti podpory	127
7.3.3 Podporované aktivity	127
7.3.4 Typ podpory	127
7.3.5 Forma a výše podpory	127
7.3.6 Přijemci	128
7.3.7 Cílové skupiny	128
7.3.8 Územní zaměření podpory	128
7.3.9 Časový plán	128
7.3.10 Kategorie oblasti intervence	128
7.3.11 Indikátory	128
7.3.12 Finanční plán	130
8 Finanční rámec	131
8.1 Způsobové výdaje	133
8.2 Křizové financování	134
8.3 Veřejná podpora	134
9 Partnerství	134
10 Řízení a implementace OP VK	134
11 Publicita a informovanost	134



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Příprava projektu

---

Základní dokumenty:

- Text konkrétní výzvy týkající se dané prioritní osy (respektive oblasti podpory)

V OP VK –

1. počáteční vzdělávání,
  2. terciární vzdělávání a věda a výzkum,
  3. další vzdělávání,
  4. technická pomoc
-

# Příprava projektu

---

- ❑ Výzva (určuje termín, kdy je nutno projekt odevzdat se všemi náležitostmi, zpravidla 45 dní)
  - ❑ Nedodržení termínů/pokladů/náležitostí – zpravidla vyřazení projektu
  - ❑ Variantou je možnost kontinuální výzvy (OP CZ-P)
-



# Příprava projektu

## Výše dotace

	Maximální možná výše dotace (v %)		
Typ žadatele	Projekt nezakládající veřejnou podporu a nevytvářející další příjmy	Projekt zakládající veřejnou podporu na základě Nařízení ES č.800/2008	Projekt vytvářející příjmy (projekt nezakládající veřejnou podporu s celkovými náklady většími než 1 mil. EUR)
<b>Malý podnik</b>	92,5 % z celkových způsobilých výdajů (85 % ze Strukturálních fondů a 7,5 % ze státního rozpočtu)	60 %	Dotace bude vypočtena na základě finanční mezery <sup>1</sup> , přičemž maximální dotace může činit 92,5 % z celkových způsobilých výdajů (s rostoucí mírou zisku se bude dotace snižovat)
<b>Střední podnik</b>		50 %	
<b>Velký podnik</b>		40 %	

**Malý podnik:** méně než 50 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma ≤ 10 mil. EUR

**Střední podnik:** 50-250 zaměstnanců včetně, roční obrat ≤ 50 mil. EUR nebo bilanční suma ≤ 43 mil. EUR

**Velký podnik:** nad 250 zaměstnanců, roční obrat ≥ 50 mil. EUR nebo bilanční suma ≥ 43 mil. EUR

- **Obec, kraj** je považován vždy za **velký podnik**.
- **Nestátní nezisková organizace** se řídí pravidly metodického pokynu Definice malého a středního podniku.
- **Organizace zřízené a založené obcí, krajem nebo dobrovolnými svazky obcí** se považují za velký podnik, .

# Příprava projektu

---

## **Definice záměru**

Definice záměru by měla obsahovat odpovědi na otázky:

- Proč je nutné projekt realizovat?
- Pro koho je projekt určen?
- Čeho chcete v projektu dosáhnout?
- Jakým způsobem chcete dosáhnout cílů projektu?
- Jaké aktivity chcete v projektu realizovat?
- Kdo bude plánované aktivity realizovat?

---

Již ve fázi zpracovávání záměru projektu je víc než vhodné konzultovat své představy s projektovými manažery poskytovatele (Regionální rady, ministerstva, kraje, atd.)

# **Příprava výzkumného projektu (osnova)**

---

- celkem 3-4 strany (1500 – 2000 slov)
-

# 1) název projektu (max 15 slov)

---

- Stručně a jasně** vystihuje podstatu projektu
  - Musí z něj být zřejmé, o co jde
-

## 2) abstrakt projektu (max 6 řádků)

---

### □ **Stručný výtah projektu sloužící k orientaci**

- Nastínění problému
  - Použité metody výzkumu
  - Předpokládané výsledky výzkumu
  - Může obsahovat i citace (nejvýznamnější)
-

### 3) klíčová slova (max 5 slov)

---

- Jasně a přehledné vymezení tématu výzkumu – jak **tematicky**, tak **regionálně**, tak **metodicky**
-

## 4) cíle projektu

---

- 1 hlavní cíl
- 2 dílčí cíle

- Co chcete řešením projektu dosáhnout**
-

## 4) hypotézy

---

- ❑ **Předpokládaná skutečnost, kterou ve výzkumu potvrdíme nebo vyvrátíme** (výchozí předpoklad k ověření)
  - ❑ Hypotéza rozpracovává domněnku
  
  - ❑ 1 hlavní hypotéza
  - ❑ 2 dílčí hypotézy
-



# 5) rešerše tematické odborné literatury

---

- ❑ Knihovny
  - ❑ Elektronické zdroje (databáze)
  - ❑ Web (scholar.google / books.google)
  
  - ❑ 1) shromážděte si podklady, prostudujte je, dělejte si poznámky – **vyhledávejte to podstatné k problému** (terminologie, metodika)
  - ❑ 2) jasně si **definujte výzkumný problém/téma** (zamezíte dalšímu a dalšímu rozšiřování tématu), hierarchicky si vymezte podtémata
  - ❑ 3) dbejte na **logickou posloupnost**
  - ❑ 4) pokuste se pochopit **podstatu problému** (širší souvislosti problému)
  - ❑ **NEKOPIRUJTE CIZÍ TEXTY, VYBERTE Z NICH TO PODSTATNÉ – CITUJTE ZDROJE**
-

## 6) společenská relevance

---

- zdůvodnění aktuálnosti a potřeby řešení
  - max 0,5 strany
-

# 7) metodika výzkumu

---

- max 0,5 strany
-

## 8) popis jednotlivých aktivit projektu

---

- 6 aktivit – ke každé max 6 řádků
-



# 10) předpokládané výsledky

---

- možný aplikační přínos pro praxi  
(max 6 řádků)
-

# 11) přehled tematické odborné literatury

---

- max 20 položek dle citační normy
-

## 12) projektový tým

---

- rozdělení kompetencí (odborných, manažerských)
  
  - CV (max 5 řádků)
-



# Příprava projektu

---

## Management projektu

## Odborné zabezpečení

veškeré **plánování, organizování, řízení** a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. Ve týmu by se měly vyskytnout hlavně osoby, v jejichž kompetenci bude např. řízení projektu, realizace výběrových řízení, účtování projektu, právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, publicita apod.

---

# 13) rozpočet projektu

---

- osobní náklady (každý řešitel bude zaměstnán na 0,3 úvazku s průměrným platem v ČR k únoru 2011);  
**položky: 1) hrubá mzda; 2) sociální a zdravotní pojištění (36 % hrubé mzdy); 3) sociální fond (2 % hrubé mzdy); 4) součet 1-3**
  - cestovní náklady (cestovné, ubytování)
  - nákup odborné literatury (20 položek včetně cen)
  - realizace výzkumu
  - nákup přístrojového vybavení (PC, licence softwaru)
-

Úvod - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Ol... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Úvod

Nacházíte se: Úvod

# Benefit7

Nejste přihlášen/-á

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operace

- Registrace
- Seznam formulářů
- Informace o provozování
- Pravidla dostupnosti
- Certifikáty
- Systémové požadavky

## Úvod

Informační systém BENEFIT7 je určen pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013.

Pro správné fungování aplikace BENEFIT7 musíte mít nainstalovány tyto [certifikáty](#).

### Aktuální provozní informace portálu

- Upozornění pro příjemce pomoci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Řídicí orgán vydal v březnu 2010 nové pokyny pro vyplnění Zjednodušené žádosti o platbu v režimu **EX-ANTE** a **EX-POST**. Pokyny naleznete přímo v Benefitu7 přes tlačítko "**Pokyny řídicího orgánu**". Řídicí orgán OP LZZ.
- Ve čtvrtek dne **1.4.2010 od 18 hod.** bude probíhat redesign firewalové soustavy Ministerstva financí a proto **nebude po dobu této akce přístupný ARES**. Předpokládaná doba přerušení provozu je do 2.4.2010 do 6.00 hod. Děkujeme za pochopení.
- Ke dni **29.3.2010** bylo v systému BENEFIT7 zaregistrováno **32416 uživatelů**, kteří založili **68443 žádosti**. Z tohoto počtu bylo **32377 žádostí** předáno k vyhodnocení řídicím orgánům.

» Přihlášení «

E-mail:

Heslo:

[Zapomenuté heslo](#)

Provoz a úprava IS KP (aplikace BENEFIT7) je předmětem příslušných projektů OPTP dotovaných z prostředků fondů EU a státního rozpočtu. Služby Systémové integrace CRR ČR jsou předmětem projektu OPTP dotovaného z prostředků fondů EU a státního rozpočtu.

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOČ

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Provoz a úprava aplikace BENEFIT7 pro OP PS ČR – Polsko je předmětem projektu TA tohoto OP dotovaného z prostředků fondů EU a státního rozpočtu.

CZ **PI** Cíl 3 / Cel 3  
2007, 2013

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

IT PRODUKT 2009  
COMPUTERWORLD

Hotovo

Start Úvod - Mozilla Firefox Microsoft PowerPoint ... Windows Media Player Clipboard12 - IrfanVi... CS 12:45



- Navigace**
  - Konto žádosti
  - Nápověda
  - Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
  - Přístup k žádosti
  - Kopírovat
  - Zpráva
  - Tisk
- Datová oblast žádosti**
  - Identifikace žádosti
  - Projekt
  - Žadatel projektu
  - Adresa žadatele
  - Osoby žadatele
  - Partner projektu
  - Popis projektu
  - Území dopadu a realizace
  - Klíčové aktivity
  - Harmonogram aktivit
  - Realizační tým
  - Rozpočet projektu
  - Přehled financování
  - Harmonogram čerpání
  - Horizontální témata
  - Kategorizace pomoci
  - Monitorovací indikátory
  - Dodavatelé pro VŘ
  - Výběrová řízení
  - Publicita

### Identifikace žádosti

Identifikace žádosti v BENEFIT7 (max. 20 znaků)  
Geonika 001

Název projektu  
Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

Klíč žádosti	Klíč verze	Registrační číslo
0vobuP	0001	CZ.1.07/2.3.00/09.0234

Datum založení žádosti	Datum finalizace
27. listopadu 2008 20:19:23	11. prosince 2008 17:47:42

Stav	Stav zpracování
Předaný	Projekt v realizaci

Vlastník  
MARTINAT@GEONIKA.CZ

Poslední změna žádosti  
15. října 2009 7:52:46

Naposledy změnil  
MARTINAT@GEONIKA.CZ

Projekt - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_10

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Ob... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Projekt

**Navigace**

- Konto žádosti
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu

**Operace se žádostí**

- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk

**Datová oblast žádosti**

- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým
- Rozpočet projektu
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

## Projekt

Číslo OP	Název OP	
CZ.1.07	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	
Číslo výzvy	Název výzvy	
09	Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.3	
Prioritní osa	Název prioritní osy	
7.2	Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj	
Oblast podpory	Název oblasti podpory	
7.2.3	Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji	

Typ účetní jednotky	Účetní osnova
Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činn	504/2002 Sb. 401-414 (FZ 06/2003)

Název IPRM	Kód IPRM
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Název aktivity IPRM	Číslo aktivity
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Typ projektu

IP - ostatní

Název projektu

Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

Zkrácený název projektu

Geonika - geografie

Název projektu anglicky

Advancement of professional abilities and skills of geographers from Institute of Geonics AS CR

Stručný obsah projektu


Obsahem projektu jsou aktivity rozvíjející profesní schopnosti a dovednosti geografů Ústavu geoniky AV ČR. Lze jej rozdělit do několika částí. 1) odborné jazykové vzdělávání pracovníků ústavu jako předpoklad pro větší zapojení do mezinárodní vědecké komunity (projekty, sítě). 2) vzdělávání v oblasti prezentačních a komunikačních schopností. 3) další vzdělávání v...

Pokud zrušíte zaškrtnutí Projekt má partnera budou vymazána data o partnerovi ( partnerech), jeho adrese ( adresách) i osobě ( osobách). Zároveň budou vymazány existující podřízené záznamy dat, na kterých se navázaný partner ( partneři) podílel.

Projekt má partnera

Hotovo

Start Projekt - Mozilla Firefox Microsoft PowerPoint ... Windows Media Player Clipboard13 - IrfanVi... CS 12:49

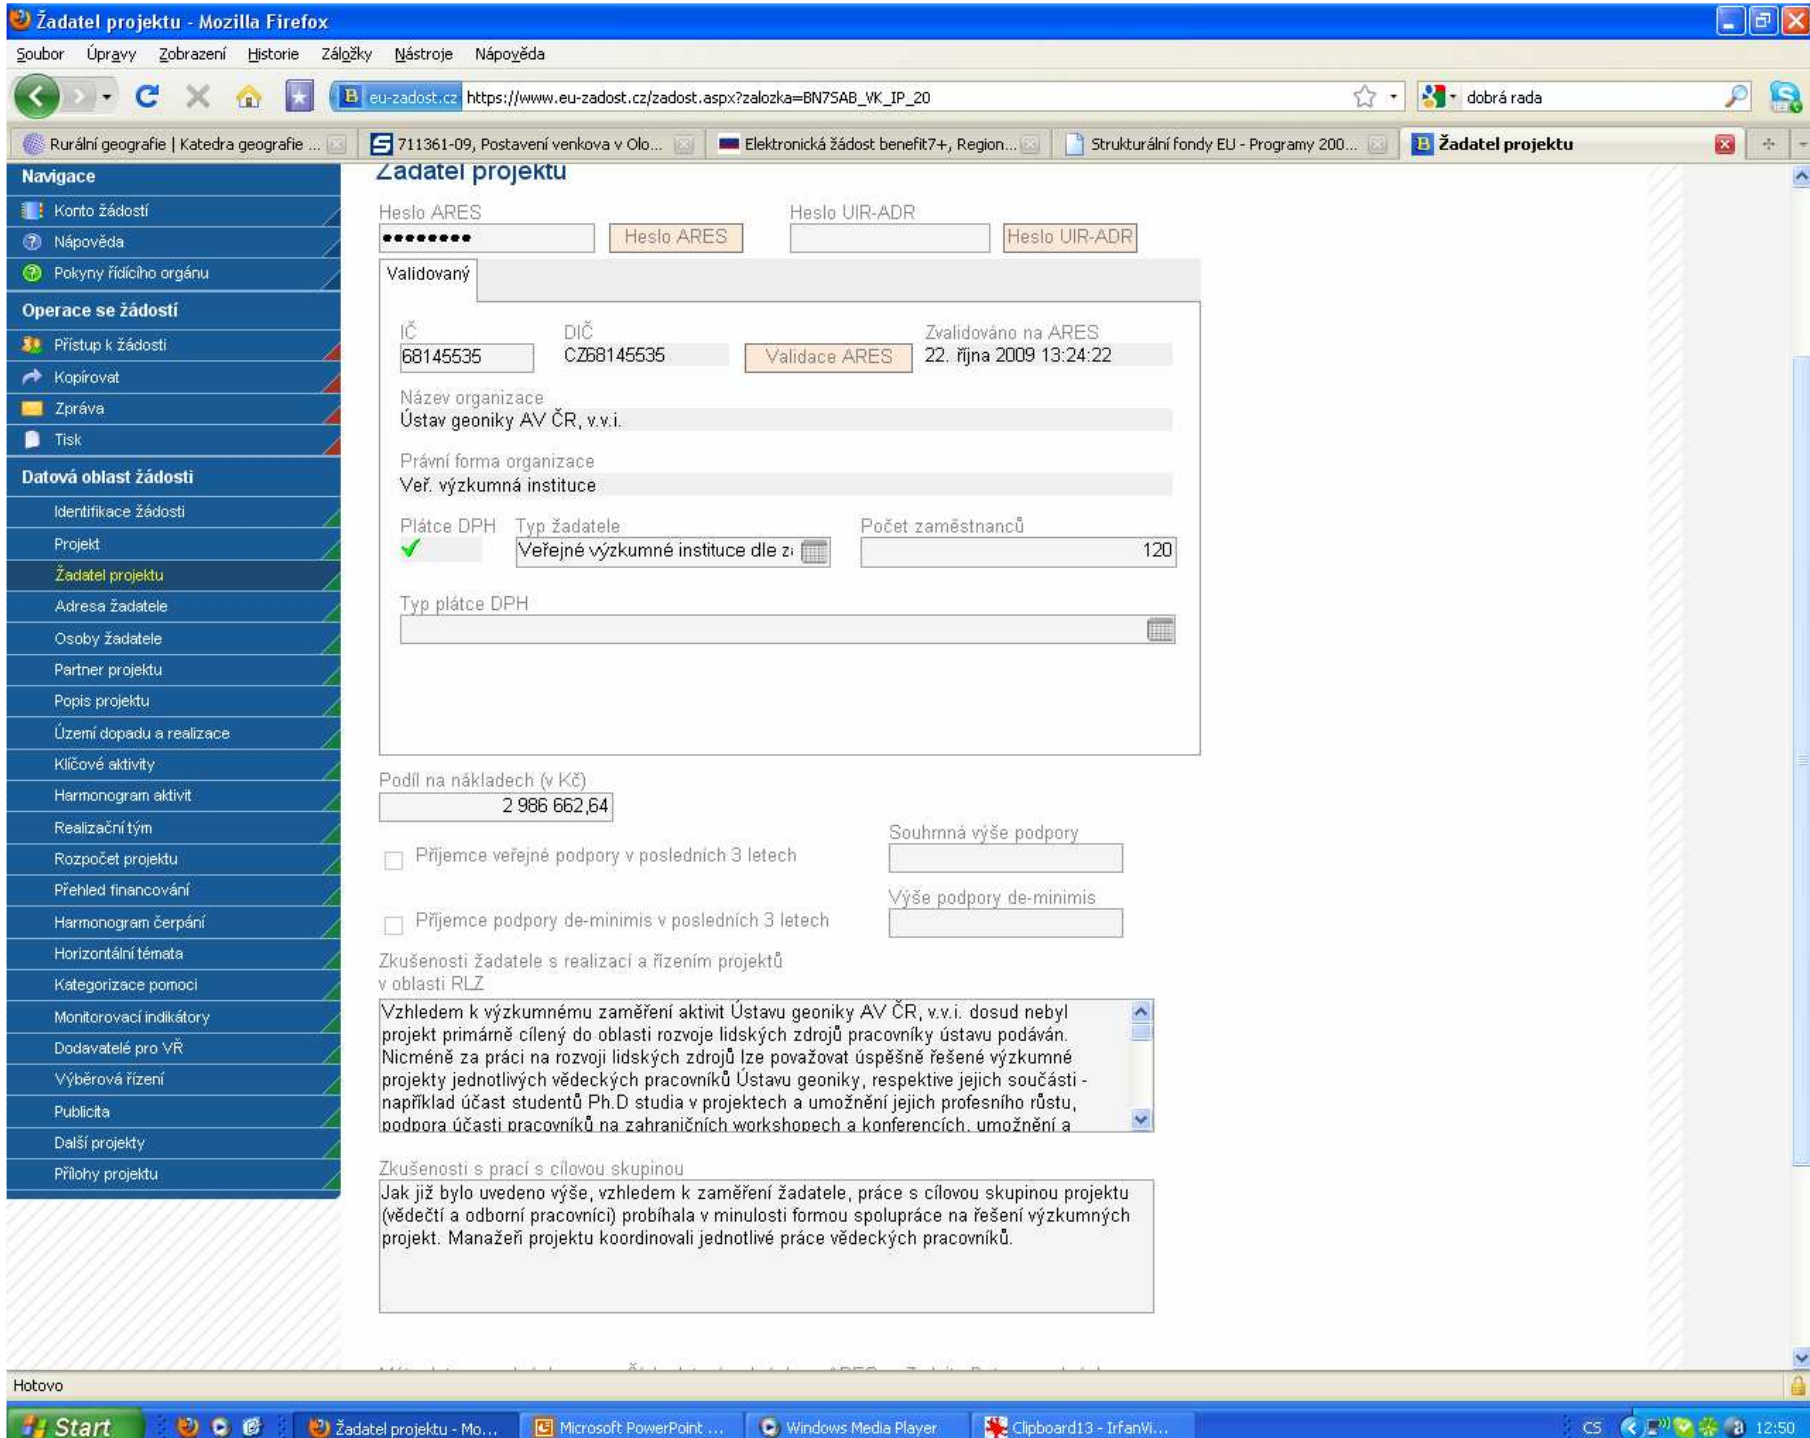

- Navigace**
  - Konto Žadosti
  - Nápověda
  - Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
  - Přístup k žádosti
  - Kopírovat
  - Zpráva
  - Tisk
- Datová oblast žádosti**
  - Identifikace Žadosti
  - Projekt
  - Žadatel projektu**
  - Adresa žadatele
  - Osoby žadatele
  - Partner projektu
  - Popis projektu
  - Území dopadu a realizace
  - Klíčové aktivity
  - Harmonogram aktivit
  - Realizační tým
  - Rozpočet projektu
  - Přehled financování
  - Harmonogram čerpání
  - Horizontální témata
  - Kategorizace pomoci
  - Monitorovací indikátory
  - Dodavatelé pro VŘ
  - Výběrová řízení
  - Publicita
  - Další projekty
  - Přílohy projektu

### Žadatel projektu

Heslo ARES  Heslo ARES  
 Heslo UIR-ADR  Heslo UIR-ADR

Validovaný

IČ  DIČ  Zvalidováno na ARES   
 Validace ARES

Název organizace

Právní forma organizace

Plátce DPH  Typ žadatele  Počet zaměstnanců

Typ plátce DPH

Podíl na nákladech (v Kč)

Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech

Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ

Vzhledem k výzkumnému zaměření aktivit Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. dosud nebyl projekt primárně cílený do oblasti rozvoje lidských zdrojů pracovníky ústavu podáván. Nicméně za práci na rozvoji lidských zdrojů lze považovat úspěšně řešené výzkumné projekty jednotlivých vědeckých pracovníků Ústavu geoniky, respektive jejich součástí - například účast studentů Ph.D studia v projektech a umožnění jejich profesního růstu, podpora účasti pracovníků na zahraničních workshopech a konferencích. umožnění a

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou

Jak již bylo uvedeno výše, vzhledem k zaměření žadatele, práce s cílovou skupinou projektu (vědeckí a odborní pracovníci) probíhala v minulosti formou spolupráce na řešení výzkumných projekt. Manažeré projektu koordinovali jednotlivé práce vědeckých pracovníků.

Popis projektu - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_80

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Olo... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Popis projektu

Nacházíte se: Konto žádostí - Geonika 001 - Popis projektu Odhlášení za: 59:39 31.03.2010 12:51:17

### Navigace

- Konto žádostí
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu

### Operace se žádostí

- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk

### Datová oblast žádosti

- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu**
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým
- Rozpočet projektu
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

## Popis projektu

#### Cíle projektu

Cílem projektu je rozvíjet profesní schopnosti a dovednosti geografů na oddělení geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě a Brně. Primárním cílem je větší míra zapojení vědeckých pracovníků Ústavu geoniky AV ČR do mezinárodní vědecké komunity. Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé aktivity navrhovaného projektu. Primárním předpokladem zapojení pracovníků Ústavu geoniky do mezinárodních sítí, projektů je jejich jazykové vybavení, které v současné době není na dostatečné úrovni. Jde především o

#### Zdůvodnění potřebnosti

Navrhované aktivity projektu vychází z diskusí pracovníků ústavu zaměřených na problematické oblasti v rámci jejich schopností a dovedností. Ukázalo se, že nejpalcivějšími body jsou jednak nedostatečná jazyková úroveň odborných a vědeckých pracovníků (geografů) ústavu, úroveň jejich prezentačních a komunikačních schopností a také limitovaná úroveň jejich dovedností v oblasti využívání geografických informačních systémů (GIS). Dalším okruhem je intenzifikace míry zapojení pracovníků ústavu do mezinárodních

#### Popis cílové skupiny

První z cílových skupin navrhovaného projektu jsou vědečtí a odborní pracovníci oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., které má své pracoviště v Brně a v Ostravě (celkem 20 pracovníků). Druhou z cílových skupin projektu jsou studenti geografických oborů Ostravské univerzity (viz pedagogické aktivity pracovníků ústavu), třetí pak studenti geografických oborů a odborná geografická veřejnost, která se bude účastnit cvklu přednášek zahraničních expertů. Přednášky se budou konat v Brně, kde budou mít

#### Zapojení a motivace cílové skupiny

Cílová skupina vědeckých pracovníků, geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. bude do projektu zapojena ve všech bodech projektu (viz výše). Motivací je zvýšení úrovně svých jazykových schopností, prezentační a komunikačních dovedností a také zvýšení úrovně znalostí práce s geografickými informačními systémy. Vědecké pracovníky také motivuje možnost publikace v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech, prezentace dosavadních výsledků svých výzkumů na mezinárodním odborném fóru. Zájem na

#### Přínos pro cílovou skupinu

Konkrétní přínos projektu pro cílové skupiny: 1) vědečtí pracovníci, geografové Ústavu geoniky AV ČR - zlepšení odborných jazykových znalostí a jejich využití při další vědecké práci; zlepšení úrovně prezentačních a komunikačních dovedností; zlepšení dovedností v práci s geografickými informačními systémy (GIS) a jejich metodická aplikace do svých výzkumů; podpora aktivních vystoupení na zahraničních workshopech a konferencích - zde je přínosem prezentace výsledků svých výzkumů na mezinárodním fóru, jejich potenciální

#### Rizika projektu

Rizika, že by projekt nemohl být realizován v rozsahu, jak je navrhován, jsou minimální. Nalezení vhodných lektorů pro jazykové vzdělávání nepředstavuje výrazný problém, stejně tak nalezení školitelů pro kurz komunikačních a prezentačních schopností a školení ve využívání geografických informačních systémů (GIS; software ARC GIS, školí ARC Data Praha, oficiální zástupce firmy ESRI v ČR). Další část projektu (vystoupení na zahraničních konferencích) je aktivitou, která již v současné době probíhá, jde o její zintenzivnění (zvýšení

Hotovo

Start Popis projektu - Mozill... Microsoft PowerPoint ... Windows Media Player Clipboard13 - IrfanVi... CS 12:51

Popis projektu - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_80

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Olo... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Popis projektu

- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro vř
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

**Přínos pro cílovou skupinu**

Konkrétní přínos projektu pro cílové skupiny: 1) vědeckí pracovníci, geografové Ústavu geoniky AV ČR - zlepšení odborných jazykových znalostí a jejich využití při další vědecké práci; zlepšení úrovně prezentačních a komunikačních dovedností; zlepšení dovedností v práci s geografickými informačními systémy (GIS) a jejich metodická aplikace do svých výzkumů; podpora aktivních vystoupení na zahraničních workshopech a konferencích - zde je přínosem prezentace výsledků svých výzkumů na mezinárodním fóru, jejich potenciální

**Rizika projektu**

Rizika, že by projekt nemohl být realizován v rozsahu, jak je navrhován, jsou minimální. Nalezení vhodných lektorů pro jazykové vzdělávání nepředstavuje výrazný problém, stejně tak nalezení školitelů pro kurz komunikačních a prezentačních schopností a školení ve využívání geografických informačních systémů (GIS; software ARC GIS, školi ARC Data Praha, oficiální zástupce firmy ESRI v ČR). Další část projektu (vystoupení na zahraničních konferencích) je aktivitou, která již v současné době probíhá, jde o její zintenzivnění (zvýšení

**Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik)**

Rizikům, jakkoli nízkým, uvedeným v předchozím bodě, lze předcházet. Lektori pro vzdělávání budou osloveni a vybráni v dostatečném předstihu (v časovém plánu je pro to ponechán dostatečný prostor), aby se předešlo problémům. Stejně tak účast na zahraničních konferencích bude řešena tak, aby se předcházelo možným termínovým kolizím. Organizace cyklu přednášek - zde bude riziko eliminováno jednak dostatečným časovým předstihem, jednak oslovením více potenciálních přednášejících, stejně tak budou

**Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF**

Po ukončení financování z ESF bude část aktivit zachována. Jde zejména o jazykové vzdělávání, dále školení pro využívání geografických informačních systémů (zde půjde o školení organizované z vnitřních zdrojů pracoviště - pro kurz financovaný z ESF budou pracovníci rozděleni do 2 skupin podle dosavadní úrovně znalostí práce s geografickými informačními systémy; následně po ukončení financování z ESF bude interní školení vedeno pracovníky ústavu ze skupiny s vysokou úrovní znalostí, s periodicitou 1x ročně). Stejně tak

**Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní**

Přidanou hodnotou projektu je bezesporu rozvoj a intenzifikace spolupráce geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. se zahraničními partnery. Realizace projektu zvýší hodnotu pracovníků ústavu na trhu práce, nicméně vzhledem ke zlepšení pracovních podmínek a prestiže ústavu, dojde k omezení odchodů pracovníků za lepšími podmínkami. Přidanou hodnotou je také navázání nových kontaktů s prestižními zahraničními geografickými pracovišti a navázání spolupráce formou mezinárodních sítí a projektů. Bude také

**Vazby na jiné projekty**

Předkládaný projekt má úzké vazby na výzkumné projekty řešené aktuálně na geografickém oddělení Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Dojde k prezentaci dosavadních výsledků výzkumů na mezinárodním fóru, čímž se potenciálně zvýší ohlas těchto výsledků, respektive zapojení pracovníků do nových, mezinárodních projektů. Jde zejména o tyto projekty: Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí řšeitel: Mgr. Martinát. KJB300860902, financováno Grantovou

**Vnitřní postupy řízení a organizace**

Projekt bude řešen na geografickém oddělení Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., které se skládá z pracoviště v Brně a pracoviště v Ostravě. Geografickému rozložení zúčastněných pracovišť odpovídá i řízení projektu, jeho organizace. Realizaci projektu bude řešit tým 6 osob (Mgr. Stanislav Martinát, Mgr. Petr Dvořák, Eva Sochorková - Ústav geoniky AV ČR, Ostrava; Mgr. Bohumil Frantál, Mgr. Eva Nováková, Dagmar Nováková - Ústav geoniky AV ČR, Brno. Projekt řídí a zodpovídá za něj koordinátor projektu a manažer projektu pro

Hotovo

Start Popis projektu - Mozill... Microsoft PowerPoint ... Windows Media Player Clipboard13 - IrfanVi... CS 12:51



Klíčové aktivity - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_100

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Ol... Elektronická žádost benefi7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Klíčové aktivity

Ruční žádosti

Nápověda

Pokyny řídicího orgánu

Operace se žádostí

Přístup k žádosti

Kopírovat

Zpráva

Tisk

Datová oblast žádosti

Identifikace žádosti

Projekt

Žadatel projektu

Adresa žadatele

Osoby žadatele

Partner projektu

Popis projektu

Území dopadu a realizace

**Klíčové aktivity**

Harmonogram aktivit

Realizační tým

Rozpočet projektu

Přehled financování

Harmonogram čerpání

Horizontální témata

Kategorizace pomoci

Monitorovací indikátory

Dodavatelé pro VŘ

Výběrová řízení

Publicita

Další projekty

Přílohy projektu

Číslo aktivity	Název klíčové aktivity	ESF způsobilé výdaje	Křížové financování	Celkem způsobilé výdaje aktivity
01	Odborné jazykové vzdělávání	372 125,00	0,00	372 125,00
02	Kurz prezentačních, komunikačních sc	39 700,00	0,00	39 700,00
03	Vzdělávání pro využívání geografických	129 000,00	0,00	129 000,00
04	Podpora aktivních vystoupení na zahra	445 464,00	0,00	445 464,00
05	Organizace cyklu zvaných přednášek e	621 526,00	0,00	621 526,00
06	Podpora pedagogických aktivit	186 921,00	0,00	186 921,00
07	Zahraníční stáž 1	90 440,00	0,00	90 440,00
08	Zahraníční stáž 2	45 220,00	0,00	45 220,00
09	Zahraníční stáž 3	28 560,00	0,00	28 560,00
10	Nákup odborné literatury	169 688,80	0,00	169 688,80

Číslo aktivity  
01

Název klíčové aktivity  
Odborné jazykové vzdělávání

Náklady na klíčovou aktivitu

Celkem způsobilé výdaje aktivity  
372 125,00

ESF způsobilé výdaje  
372 125,00

Křížové financování  
0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Odborné jazykové vzdělávání, jehož cílovou skupinou jsou vědecktí a odborní pracovníci geografického oddělení Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě a Brně bude probíhat ve 22 měsících navrhovaného projektu (od července 2009 do dubna 2011). Jde tedy o aktivity, kterou je vzhledem ke svému obsahu (výuka jazyků) nutné pro dosažení patřičné efektivity řešit dlouhodobě. Vyučované jazyky budou angličtina, němčina a ruština. Půjde o individuální výuku ve dvoicích (flekto-student), která je pro dosažení stanoveného cíle (tedy

Výstup klíčové aktivity

Výstupem této klíčové aktivity bude zvýšení odborných jazykových znalostí odborných a vědeckých pracovníků geografického oddělení Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Tyto znalosti budou ověřeny zejména aktivní účastí pracovníků na zahraničních vědeckých konferencích a workshopech (prezentace dosavadních výsledků), jednak stážemi 3 pracovníků na prestižních geografických pracovištích v Holandsku (Amsterdam University) a ve Velké Británii (Birmingham University, Queen Mary University, London). Jazykové vzdělávání

Hotovo

Start Klíčové aktivity - Mozil... Microsoft PowerPoint ... Windows Media Player Clipboard13 - IrfanVi... CS 12:52



- Navigace**
- Konto žadostí
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk
- Datová oblast žádosti**
- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit**
- Realizační tým
- Rozpočet projektu
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita

### Harmonogram aktivit

Rok	Klíčová aktivity	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2009	Odborné jazykové vzdělávání							✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Kurz prezentačních, komunik							✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Podpora aktivních vystoupen						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Podpora pedagogických akti									✓	✓	✓	✓
2009	Zahraníční stáž 1									✓			
2009	Zahraníční stáž 2										✓		
2009	Nákup odborné literatury						✓						
2010	Odborné jazykové vzdělávání	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Vzdělávání pro využívání geo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Podpora aktivních vystoupen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Organizace cyklu zvaných pře	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Podpora pedagogických akti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Zahraníční stáž 3				✓								
2010	Nákup odborné literatury						✓						
2011	Odborné jazykové vzdělávání	✓	✓	✓	✓								
2011	Podpora aktivních vystoupen	✓	✓	✓	✓	✓							
2011	Organizace cyklu zvaných pře	✓											
2011	Podpora pedagogických akti	✓	✓	✓	✓	✓							
2011	Nákup odborné literatury			✓									

Rok

Výběr klíčové aktivity

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.
- VI.
- VII.
- VIII.
- IX.
- X.
- XI.
- XII.

- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk
- Datová oblast žádosti**
- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým**
- Rozpočet projektu
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

Strukturální fondy EU - Programy 2007 — 2013

Číslo	Název pozice	Název subjektu	Úvazek	Jednotka	Forma
001	Koordinátor projektu + manažer	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	13,00	%	Pracovní smlouva
002	Zástupce koordinátora projektu	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	13,00	%	Pracovní smlouva
003	IT podpora	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	7,00	%	Pracovní smlouva
004	Odborný administrativní asister	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	10,00	%	Pracovní smlouva
005	Finanční manažer	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	10,00	%	Pracovní smlouva
006	Manažer pro komunikaci ze zah	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	10,00	%	Pracovní smlouva
007	Vědecko-pedagogický pracovník	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	15,00	%	Pracovní smlouva
008	Vědecko-pedagogický pracovník	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	15,00	%	Pracovní smlouva

Výběr typu pozice

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice

Koordinátor projektu + manažer pro Ostravu

Název subjektu

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

13,00

Jednotka

%

Popis úvazku

Sazba (hrubá mzda, Kč)

65 760,00

Jednotka

za měsíc

Přepočet dle úvazku

8 548,80

Pracovní náplň

Koordinátorem projektu je Mgr. Stanislav Martinát s 13% výší pracovního úvazku. Mgr. Martinát je zároveň manažerem projektu pro ostravské geografické pracoviště Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Koordinátor řídí a koordinuje projekt, zajišťuje komunikaci a konzultace s poskytovatelem podpory, na návrh ostatních členů realizačního týmu rozhoduje o lektorech, kteří budou pověřeni jazykovým vzděláváním, vzděláváním v oblasti

- Navigace**
- Konto Žádosti
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
- Přístup k Žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk
- Datová oblast žádosti**
- Identifikace Žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým
- Rozpočet projektu**
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

## Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkov. cena	DPH	Celkem	Procento
01	OSOBNÍ NÁKLADY				0,00	961 128,88	32,18
01.01	Platy, odměny z dohod a pojistn				0,00	702 958,80	23,54
01.01.01	Náklady na odborné zaměstnar				0,00	125 490,00	4,20
01.01.01.01	Platy	os. * měs.	30,00	4 183,00	0,00	125 490,00	4,20
01.01.01.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	Náklady na administrativní zam				0,00	577 468,80	19,33
01.01.02.01	Platy	os. * měs.	144,00	4 010,20	0,00	577 468,80	19,33
01.01.02.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Sociální pojištění		1,00	182 769,2	0,00	182 769,29	6,12
01.03	Zdravotní pojištění		1,00	63 266,29	0,00	63 266,29	2,12
01.04	FKSP		1,00	12 134,50	0,00	12 134,50	0,41
01.05	Jiné povinné údaje (Zákonné p		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 15				69 350,00	796 150,00	26,66
02.01	Služební cesty tuzemské				4 370,00	212 170,00	7,10
02.01.01	Cestovné (vč. provozu služebn	cesta	20,00	1 000,00	3 800,00	23 800,00	0,80
02.01.02	Ubytování	osoba*dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Stravné	osoba*dei			0,00	184 800,00	6,19
02.01.03.01	Stravné - zahraniční experti v ČF		30,00	6 000,00	0,00	180 000,00	6,03
02.01.03.02	Stravné - čeští účastníci v ČR		32,00	150,00	0,00	4 800,00	0,16
02.01.04	Nutné vedlejší výdaje		1,00	3 000,00	570,00	3 570,00	0,12
02.02	Služební cesty zahraniční				64 980,00	583 980,00	19,55
02.02.01	Cestovné (vč. provozu služebn	cesta			63 840,00	399 840,00	13,39
02.02.01.01	Cestovné - zahraniční přednáše		10,00	24 000,00	45 600,00	285 600,00	9,56
02.02.01.02	Cestovné - vědecktí pracovníci Ú		12,00	8 000,00	18 240,00	114 240,00	3,83
02.02.02	Ubytování	osoba*dei	46,00	2 000,00	0,00	92 000,00	3,08
02.02.03	Stravné	osoba*dei	50,00	1 700,00	0,00	85 000,00	2,85
02.02.04	Ostatní		1,00	6 000,00	1 140,00	7 140,00	0,24
03	ZARÍZENÍ				0,00	0,00	0,00
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				0,00	0,00	0,00
03.01.01	Software	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00	0,00
03.02.01	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- Navigace**
- Konto žadostí
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk
- Datová oblast žádosti**
- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým
- Rozpočet projektu
- Přehled financování**
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita

### Přehled financování

Příjmy projektu	0,00	Soukromé spolufinancování	0,00
Příjmy způsobilé	0,00	Příjmy nezpůsobilé	0,00
Celková výdaje projektu	2 986 662,64	<input type="button" value="Rozpad financí"/>	

<b>Veřejné spolufinancování</b>			
Veřejné celkem	2 986 662,64	Procenta veřejné	100,00
Strukturální fond	2 538 663,25	Procenta strukturální	85,00
Státní rozpočet	447 999,39	Procenta SR	15,00



- Navigace**
  - Konto žádostí
  - Nápověda
  - Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
  - Přístup k žádosti
  - Kopírovat
  - Zpráva
  - Tisk
- Datová oblast žádosti**
  - Identifikace žádosti
  - Projekt
  - Žadatel projektu
  - Adresa žadatele
  - Osoby žadatele
  - Partner projektu
  - Popis projektu
  - Území dopadu a realizace
  - Klíčové aktivity
  - Harmonogram aktivit
  - Realizační tým
  - Rozpočet projektu
  - Přehled financování
  - Harmonogram čerpání**
  - Horizontální témata
  - Kategorizace pomoci
  - Monitorovací indikátory
  - Dodavatelé pro VŘ
  - Výběrová řízení
  - Publicita

### Harmonogram čerpání

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka
01	24.8.2009	746 665,66
02	27.11.2009	400 000,00
03	26.2.2010	400 000,00
04	1.6.2010	300 000,00
05	1.9.2010	300 000,00
06	1.12.2010	300 000,00
07	16.3.2011	250 000,00
08	11.7.2011	289 996,98

Pořadí žádosti o platbu:  Předpokládaná požadovaná částka:  Datum předložení žádosti o platbu:

Horizontalní témata - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_160

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Olo... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Horizontalní témata

martinat@geonika.cz Odlhášit

Nacházíte se: [Konto Žadostí](#) - Geonika 001 - Horizontalní témata

Odlhášení za: 59:56 31.03.2010 12:55:58

### Horizontalní témata

**Vliv na rovné příležitosti**

Vyberte, jaký vliv má projekt na rovné příležitosti

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti

**Udržitelný rozvoj**


Vyberte, jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj

Hotovo

Start | Horizontalní témata - ... | Příprava projektu.ppt | Windows Media Player | Clipboard13 - IrfanVi... | CS | 12:55



- Navigace**
- Konto žadostí
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
- Přístup k žádosti
- Kopírovat
- Zpráva
- Tisk
- Datová oblast žádosti**
- Identifikace žádosti
- Projekt
- Žadatel projektu
- Adresa žadatele
- Osoby žadatele
- Partner projektu
- Popis projektu
- Území dopadu a realizace
- Klíčové aktivity
- Harmonogram aktivit
- Realizační tým
- Rozpočet projektu
- Přehled financování
- Harmonogram čerpání
- Horizontální témata
- Kategorizace pomoci
- Monitorovací indikátory**
- Dodavatelé pro VŘ
- Výběrová řízení
- Publicita
- Další projekty
- Přílohy projektu

## Monitorovací indikátory

Komentář

Kód indikátoru	Název indikátoru	Plánovaná hodnota	Měrná jednotka
07.46.00	Počet úspěšně podpořených osob	31,00	Počet osob
07.46.01	Počet úspěšně podpořených osob - muži	27,00	Počet osob
07.46.02	Počet úspěšně podpořených osob - ženy	4,00	Počet osob
07.46.70	Počet úsp. podp. os. v dalším vzděl. - VaV prac.	19,00	Počet osob
07.46.71	Počet úsp. podp. osob v dal.vzděl.- VaV prac. muži	16,00	Počet osob
07.46.72	Počet úsp. podp. osob v dal.vzděl.- VaV prac. ženy	3,00	Počet osob

Název indikátoru  
 Počet úspěšně podpořených osob

Plánovaná hodnota: 31,00      Měrná jednotka: Počet osob      Datum plánované hodnoty: 31.5.2011

Komentář



Publicita - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

eu-zadost.cz https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?zalozka=BN75AB\_VK\_IP\_190

Rurální geografie | Katedra geografie ... 711361-09, Postavení venkova v Ol... Elektronická žádost benefit7+, Region... Strukturální fondy EU - Programy 200... Publicita

Nacházíte se: [Konto žádostí](#) - Geonika 001 - Publicita Odlášení za: 59:54 31.03.2010 12:56:58

### Publicita

#### Způsob zajištění publicity

Filter

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Uvědomění příjemců pomoci
Jiné formy zajištění publicity projektu
Internetové stránky projektu
Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpra...

Způsob zajištění publicity  
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity  
Souhlasíme se zveřejněním v seznamu příjemců podpory.

Hotovo

Start Publicita - Mozilla Fire... Příprava projektu.ppt Windows Media Player Clipboard13 - IrfanVi... CS 12:56
